

Aftaleseddel VEX300T-SPLIT



VEX300
S E R I E N
MODSTRØMSVEKSLER

EXHAUSTO servicetekniker adskiller og samler SPLIT-aggregat, i henhold til ordrebekræftelse, på nedenstående adresse. Det påhviler entreprenøren med min. 2 mand at sørge for indtransport af aggregat.

EXHAUSTO ordrebekræftelse nr. _____ (udfyldes af EXHAUSTO)

OBS! Nedenstående bedes udfyldt og returneret til EXHAUSTO. Når EXHAUSTO har modtaget aftalesedlen sættes VEX i produktion. Herefter vil SPLIT-tekniker kontakte Jer for endelig fastsættelse af dato og tidspunkt for montage.

Aggregat placeres som angivet på målskitse. Alternativt kan vedlægges målsat tegning.

Udfyldes af kunde:

Monteringsadresse:

Etage: _____

Ansvarlig kontaktperson og telefonnummer:

Navn _____

Telefonnummer _____

Kontaktperson og telefonnummer på pladsen:

Navn _____

Telefonnummer _____

Ønsket tidspunkt for arbejdets udførelse:

Dato _____ Evt. klokkeslæt _____

Aftalt tidspunkt:

Dato _____ Evt. klokkeslæt _____


(Endelig dato og tidspunkt aftales med EXHAUSTO)

Modstrømsveksler og motorsektion - mål og vægt

		VEX310T	VEX320T	VEX330T	VEX340T	VEX350T
Modstrømsveksler	Højde (mm)	312	312	394	674	957
	Længde (mm)	537	537	619	899	1182
	Dybde (mm)	300	2 x 300	2 x 325	2 x 310	2 x 355
	Vægt (kg)	7,2	2 x 7,2	2 x 19,2	2 x 19,8	2 x 35
Motorsektion	Vægt (kg)	2 x 4,1	2 x 6,4	2 x 9,2	2 x 95	2 x 20
Største kabinetdel	H x B x D (mm)	1140 x 1200 x 50	1140 x 1200 x 50	1500 x 830 x 50	1900 x 825 x 50	1750 x 1200 x 50

Placering af aggregat (udfyldes af kunde):

- ☐ Aggregat placeres i henhold til målsat skitse på bagside
eller
☐ Målsat tegning af montagested vedlagt (alternativ til skitse)
☐ Særaftaler vedr. samling og montage er anført på bagside.

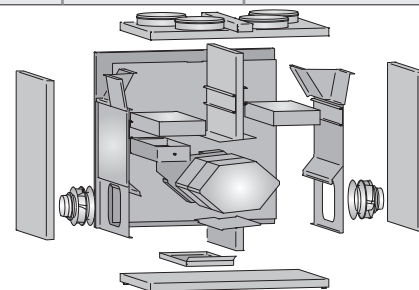

Er adgangsforhold således at største del af aggregat uhindret kan indtransporteres (aggregat adskilles i gavle, top og bund, samt motorsektion og modstrømsveksler) Ja ☐ Nej ☐

Er pladsforhold på montagestedet således at samling kan udføres uden gener (Der skal være udført platform eller lignende med min 0,5 mtr. gangbredde rundt om aggregat) Ja ☐ Nej ☐


Er der mulighed for tilslutning af byggestrøm (1x230 V) Ja ☐ Nej ☐

VEND

EXHAUSTO

Målsat skitsetegning af montagestedet (udfyldes af kunde)
Husk at angive lågeplacering !

Ved flere anlæg skal anlægsnummer angives på tegning.

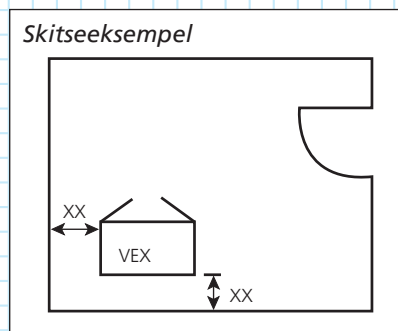

Særlige aftaler vedr. samling og montage:

Indtransport og samling

EXHAUSTO montør adskiller aggregat for indtransport.

Indtransport udføres af entreprenør.

EXHAUSTO montør samler aggregat på montagestedet i henhold til ovenstående skitse.

Ekstraarbejde, som følge af forhold på stedet, som ikke er i overensstemmelse med denne aftaleseddel, vil blive udført efter regning.

Samling af aggregat, udført af EXHAUSTOs montør er udført i henhold til denne aftale.
(underskrives ved aflevering)

Dato og underskrift kunde

Dato og underskrift EXHAUSTO A/S

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO
